

Ministério da Economia
Departamento de Transferência da União

Projeto Básico - Acompanhamento de Obras - como alimentar o sistema

Neyliane Moreno



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



www.economia.gov.br


Módulo de Projeto Básico da Plataforma +BRASIL



Objetivos

- ✓ **Inclusão pelo Proponente/Conveniente de toda a documentação necessária para caracterizar o projeto básico da Proposta, tais como projetos, licenças, ART/RRT, elaboração do QCI, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, dentre outros;**
- ✓ **Após a inclusão, toda a documentação é analisada pela Mandatária ou órgão Concedente, podendo ser aceita, rejeitada ou solicitada complementação ao Proponente/Conveniente;**
- ✓ **Caso o Contrato de Repasse se encaixe no nível II ou III, após aceite pela Mandatária, a Síntese do Projeto Aprovado (SPA) deve ser homologada pelo órgão Concedente.**

Fluxo do Projeto Básico

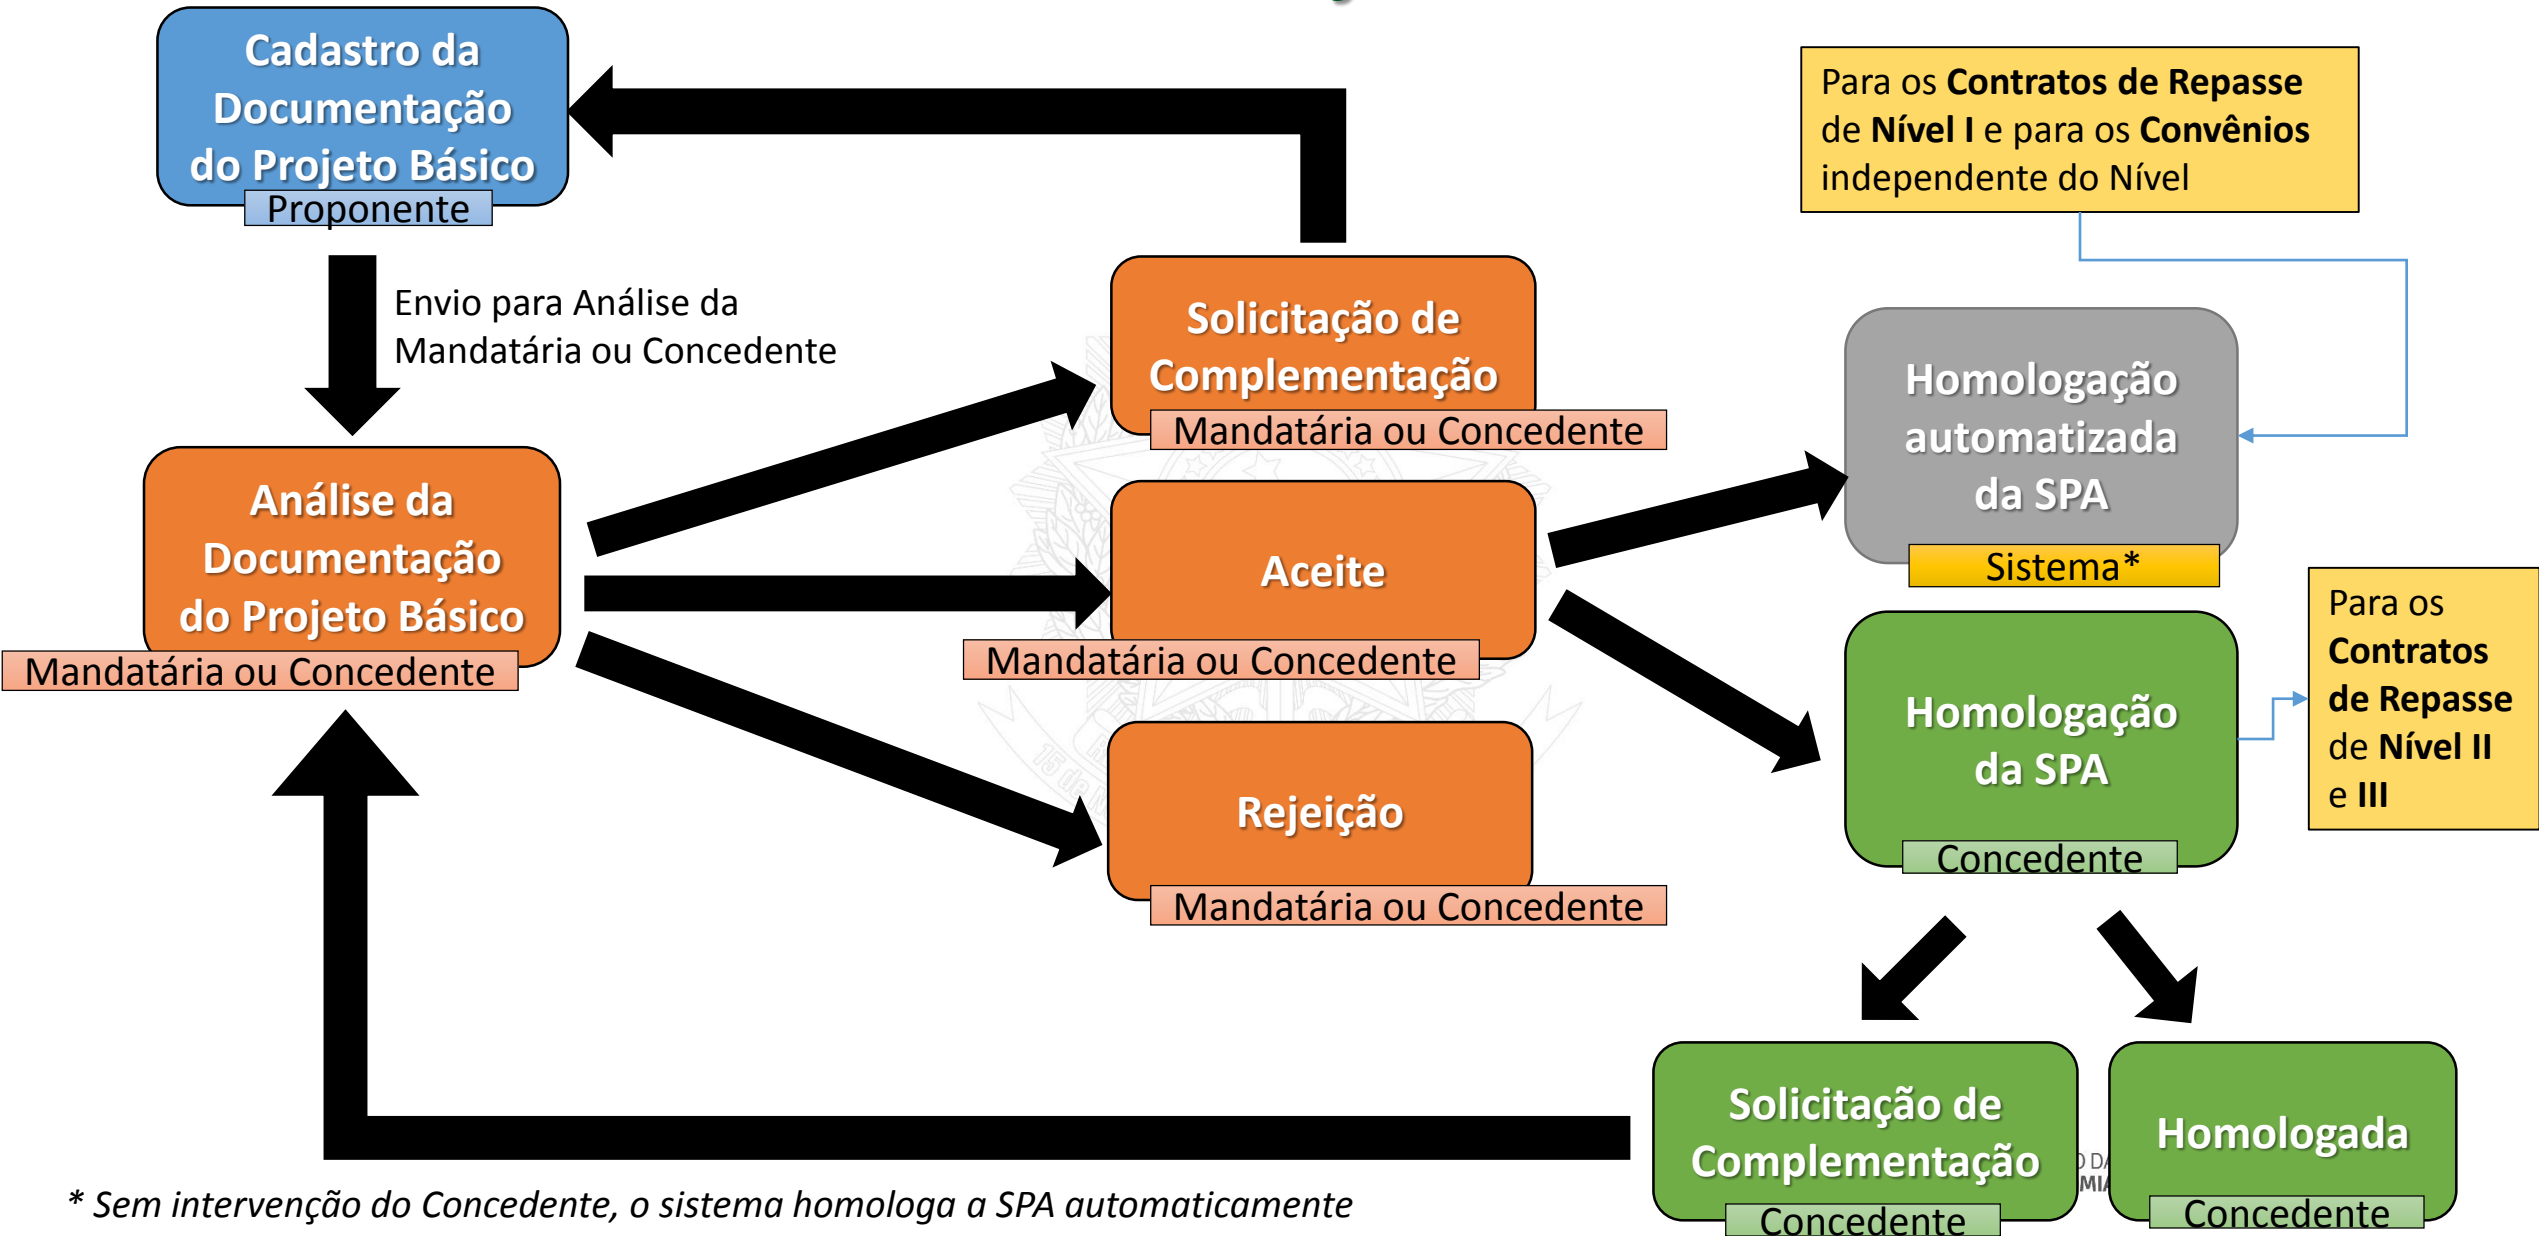

Simulação

✓ Simular o cadastro de um projeto básico de Pavimentação Asfáltica



Bem-vindo à Plataforma +Brasil

A Plataforma +Brasil constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.



ACESSO RESTRITO

CPF

Informe CPF no formato 99999999999

Senha

Senha de acesso

[Esqueceu sua senha?](#)

Entrar

Sistemas de Apoio

[Rede +Brasil](#)

[Painéis](#)

[Aplicativos](#)

[Acesso livre](#)

Central de Atendimento - 0800 978 9008

portaldeservicos.planejamento.gov.br
plataformamaisbrasil.gov.br

Simulação

29:09

Acesso à Informação



Entrar no sistema com senha 
02/09/2019 10:46-v.6.71

Principal

- ▶ Cadastro Ente/Entidade
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Convênios
- ▶ Execução
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Verificação de Regularidade



Caixa de Entrada

Propostas

» Consultar Propostas

Simulação

BRASIL

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Proposta](#)[Acesso Livre](#)

Consultar Proposta

Preencha os campos abaixo com os dados da consulta e clique em "Consultar".

Consulta Rápida:

UF/Município do Proponente

Consulta Completa:

Número da Proposta

Órgão da Proposta

Código da UG do Órgão

Situação

Modalidade

Ano

Código do Programa

Código Parlamentar

Número Emenda Parlamentar

Nome do Proponente

Tipo de Identificação do Proponente

Identificação do Proponente

UF/Município do Proponente

Simulação

29:47

[Acesso à Informação](#)[Entrar no sistema com senha](#) 
02/09/2019 11:04-v.6.71[Cadastro Ente/Entidade](#)[Programas](#)[Propostas](#)[Convênios](#)[Execução](#)[Cadastros](#)[Acomp. e Fiscalização](#)[Verificação de Regularidade](#)[Principal](#) [Consultar Proposta](#)[Acesso Livre](#)

Consultar Proposta

Escolha a Proposta - Passo 1 de 2

Selecione a PROPOSTA de seu interesse para obter o detalhamento

Filtros da pesquisa: Órgão da Proposta , Situação , Nome do Proponente , Identificação do Proponente

Página 1 de 1 (1 item(s))

Número da Proposta	Situação	Órgão da Proposta	Nome do Proponente	Possui Parecer	Identificação do Proponente
004194/2019	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	MUNICIPIO DE MOSSORO	Não	

Simulação



Entrar no sistema com senha 
02/09/2019 11:05-v.6.71

Cadastro Ente/Entidade

Programas

Propostas

Convênios

Execução

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Verificação de Regularidade

Principal > Consultar Proposta

Acesso Livre

Consultar Proposta

20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019

Dados da Proposta

Plano de Trabalho

Requisitos

Projeto Básico/Termo de Referência

Execução Concedente

Execução Conveniente

Prestação de Contas

TCE

Projeto Básico/Termo de Referência

Modalidade

Convênio

Situação

Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise

Número da Proposta

004194/2019

Lista de Documentos Digitalizados

Nenhum registro foi encontrado.

Proponente

CNPJ 08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO

Detalhar

Executores

Nenhum registro foi encontrado.

Órgão

20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Justificativa

Caracterização dos interesses recíprocos

Não considerar

Público alvo

Não considerar

Simulação – Aba Dados Gerais

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO

Voltar

Versão:

Dados Básicos

Número da Proposta:

4194/2019

Número do Convênio:

Programa:

2011320190493 - Programa - Convênio - Neyliane

Objeto:

Pavimentação Asfáltica em ruas do município: Rua Dom Pedro entre a avenida Bento Gonçalves até a Rua Bahia; Rua Bahia entre a Dom Pedro e Passo Fundo; Rua Passo Fundo entre a Rua Bahia e Rua Amazonas

Proponente:

MUNICIPIO DE MOSSORO

UF:

RN

Valor Global:

R\$ 240.124,11

Repasse:

R\$ 232.380,95

Contrapartida:

R\$ 7.743,16

Percentual Mínimo Contrapartida:

0%

Apelido do Empreendimento: *

Pavimentação em ruas do município de Mossoró

SALVAR

O campo “**Apelido do Empreendimento**” deverá ser preenchido com uma descrição sucinta para identificação rápida do empreendimento.

Simulação – Aba Dados Gerais



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO

Voltar

Versão:

i Os dados foram salvos com sucesso.

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

Quadro Resumo

Número da Proposta:

4194/2019

Número do Convênio:

Programa:

2011320190493 - Programa - Convênio - Neyliane

Objeto:

Pavimentação Asfáltica em ruas do município: Rua Dom Pedro entre a avenida Bento Gonçalves até a Rua Bahia; Rua Bahia entre a Dom Pedro e Passo Fundo; Rua Passo Fundo entre a Rua Bahia e Rua Amazonas

Proponente:

MUNICIPIO DE MOSSORO

UF:

RN

Valor Global:

R\$ 240.124,11

Repasso:

R\$ 232.380,95

Contrapartida:

R\$ 7.743,16

Percentual Mínimo Contrapartida:

0%

Apelido do Empreendimento: *

Pavimentação em ruas do município de Mossoró

Situação dos Documentos Orçamentários:

Em Elaboração

SALVAR

Aba QCI

- ✓ O Quadro de Composição do Investimento (QCI) constitui documento contratual e peça fundamental para sintetizar as partes que constituem o objeto da Proposta. Apresenta uma visão consolidada do Contrato de Repasse/Convênio contendo as metas e submetas que o compõem, suas quantidades, situação, lotes e seus respectivos valores.
- ✓ O preenchimento correto do QCI é de fundamental importância para o andamento do Instrumento de Transferência, de acordo com os conceitos de meta, submeta, item de investimento e sub-item de investimento.
- ✓ Cada submeta incluída no QCI dará origem a uma Planilha Orçamentária (PO).

Simulação – Aba QCI

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar **QCI** PO/CFR Quadro Resumo

ADICIONAR

Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Situação	Qtd.	Und.	Lote de Licitação	Repasse	Contrapartida	Total	Ações
1	Pavimentação	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO		3.794,37	M2		R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11	
1.1		Execução de Obras de Pavimentação	Em Elaboração			1	R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11	
Total Geral:							R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11	
Diferença do Valor Orçado (Proposta):							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Os **Itens de Investimento** correspondem às ações necessárias para a execução do objeto do Contrato de Repasse/Convênio, os quais são definidos pelos órgãos concedentes para cada Programa.

Os **Subitens de Investimento** são as subdivisões dos itens de investimento, correspondentes às ações ou intervenções específicas dos Contrato de Repasse/Convênio.

Simulação – Aba QCI

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019





Voltar

Versão:

Meta representa um item quantificável do Contrato de Repasse/Convênio (exemplos: 1-Pavimentação de 2450 m² no bairro Santa Tereza; 2- Construção de Creche no município de Xapuri – 350,00 m² ; 3-Construção de 2,5 Km de adutoras).

ADICIONAR

Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Situação	Qtd.	Und.	Lote de Licitação	Repasse	Contrapartida	Total	Ações
1	- Pavimentação	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO		3.794,37	M2		R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11	 
1.1		Execução de Obras de Pavimentação	Em Elaboração			1	R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11	 
Total Geral:							R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11	
Diferença do Valor Orçado (Proposta):							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Simulação – Aba QCI

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO

Voltar

Versão:

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFE	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	------------	--------	---------------

ADICIONAR

Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Situação	Qtd.	Und.	Lote de Licitação	Repasse	Contrapartida	Total	Ações
1	- Pavimentação	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO		3.794,37	M2		R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11	
1.1		Execução de Obras de Pavimentação	Em Elaboração			1	R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11	
Total Geral:							R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11	
Diferença do Valor Orçado (Proposta):							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Submeta corresponde à subdivisão da meta nos casos em que é necessário firmar mais de um contrato de execução e/ou fornecimento (CTEF) para a sua realização. No entanto, mesmo quando não houver essa necessidade, obrigatoriamente deve ser cadastrada uma submeta vinculada à meta.

Simulação – Aba QCI

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar **QCI** PO/CFF Quadro Resumo

ADICIONAR















Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Situação	Qtd.	Und.	Lote de Licitação	Repasse	Contrapartida	Total	Ações
1	- Pavimentação	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO		3.794,37	M2		R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11	
1.1		Execução de Obras de Pavimentação	Em Elaboração			1	R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11	
Total Geral:							R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11	
Diferença do Valor Orçado (Proposta):							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Lote representa a forma com que o Conveniente pretende realizar as licitações das submetas do Contrato de Repasse/Convênio. Desta forma, ao informar o mesmo número de lote para submetas distintas, significa que estas submetas serão licitadas conjuntamente e darão origem a um único CTEF.

Exemplo - QCI

Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Situação	Qtd.	Und.	Lote de Licitação	Repasse	Contrapartida	Total	Ações
1	— Pavimentação	Pavimentação de vias do município de Xapuri		3.866,08	M2		R\$ 452.827,56	R\$ 365.972,27	R\$ 818.799,83	 
1.1		Execução de obras de pavimentação	Em Elaboração			1	R\$ 452.827,56	R\$ 365.972,27	R\$ 818.799,83	 
2	— Drenagem	Drenagem no município de Xapuri		1.304,80	M		R\$ 194.519,32	R\$ 85.280,02	R\$ 279.799,34	 
2.1		Execução de obras de microdrenagem	Em Elaboração			1	R\$ 105.519,32	R\$ 85.280,02	R\$ 190.799,34	 
2.2		Aquisição de tubulação para rede de drenagem	Em Elaboração			3	R\$ 89.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.000,00	 
3	— Equipamentos Comunitários	Construção de Escola Fundamental no bairro Xororó		450,00	M2		R\$ 69.820,23	R\$ 56.428,26	R\$ 126.248,49	 
3.1		Execução de obras de construção da escola	Em Elaboração			2	R\$ 69.820,23	R\$ 56.428,26	R\$ 126.248,49	 
Total Geral:							R\$ 717.167,11	R\$ 507.680,55	R\$ 1.224.847,66	
Diferença do Valor Orçado (Proposta):							R\$ 3.885.604,33	R\$ 2.840.316,90	R\$ 6.725.921,23	

Aba Anexos

- ✓ Nesta aba deverão ser anexados todos os anexos referentes ao Projeto Básico do Contrato de Repasse/Convênio
- ✓ Os tipos de anexos são categorizados
- ✓ Os arquivos incluídos como tipo “ART/RRT” serão refletidos na aba Responsável Técnico(RT) para vinculação ao RT cadastrado.
- ✓ Os arquivos incluídos com o tipo “Autorização”, “Declaração”, “Manifesto Ambiental” e “Outorga” serão refletidos na aba “Documentação Complementar” para vinculação ao documento cadastrado.

Simulação – Aba Anexos

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO

Voltar

Versão:

Dados Básicos **Anexos** Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF Quadro Resumo

ADICIONAR ANEXO

Descrição ⇅	Tipo ⇅	Data de Envio ⇅	Enviado por ⇅	Perfil ⇅	Nome do arquivo ⇅	Ações
Projeto	Outros	02/09/2019	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	projeto.pdf	
composição	Fonte PO - Cotação / Composição	02/09/2019	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	composição.pdf	
Acessibilidade	Declaração	02/09/2019	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	declaração acessibilidade - ANEXO II.pdf	
Dispensa de Licença	Manifesto Ambiental	02/09/2019	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	dec. ambiental.pdf	
Regime de Desoneração	Declaração	02/09/2019	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	dec. regime desoneracao.pdf	
Enquadramento de Contrato	Declaração	02/09/2019	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	dec contrato.pdf	
Regime de Execução	Declaração	02/09/2019	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	dre.pdf	
BDI	Outros	02/09/2019	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	comp. bdi.pdf	
DECLARAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	Declaração	02/09/2019	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	DECLARAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO .pdf	
Planta do Município	Outros	02/09/2019	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	Planta do Município.pdf	
Memorial	Memorial Descritivo	02/09/2019	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	memorial.pdf	
ART - Projeto, Crono e Orçamen	ART / RRT	02/09/2019	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	01.PNG	

Aba Responsáveis Técnicos

- ✓ Nesta aba deverão ser informados os responsáveis técnicos e as respectivas ART/RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade Técnica) do Contrato de Repasse/Convênio.
- ✓ Os responsáveis técnicos podem ser cadastrados com os seguintes tipos de atividades: Arquitetura, Engenharia e Trabalho Social.
- ✓ Caso a Atividade seja do tipo Arquitetura ou Engenharia, serão apresentados os campos CREA/CAU e UF para serem informados.
- ✓ Apenas os responsáveis selecionados com atividade de “Arquitetura” e “Engenharia” serão apresentados para vinculação às ART/RRT e, posteriormente, às PO/CFF.

Simulação – Aba Responsáveis Técnicos

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO




Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos **Responsável Técnico** Documentação Complementar QCI PO/CFE Quadro Resumo





ADICIONAR

Responsável Técnico

CPF ↕	Nome ↕	Atividade ↕	CREA/CAU ↕	Ações
081.827.694-00	Neyliane - Engenheira	Engenharia	12345	  


ADICIONAR

Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade Técnica

ART/RRT ↕	Data Emissão ↕	Tipo	Responsável Técnico ↕	Arquivo ↕	Ações
1234567890	02/09/2019	Orçamento / Projeto / Cronograma	Neyliane - Engenheira	01.PNG	   

Aba Documentação Complementar

- ✓ Nesta aba devem ser cadastrados os documentos categorizados como Manifesto Ambiental, Outorgas, Autorizações e Declarações referentes ao Contrato de Repasse/Convênio.
- ✓ Observação: Deve ser iniciado o cadastramento destes documentos na aba “Documentação Complementar” apenas após a inclusão dos respectivos arquivos na aba “Anexos”.



Simulação – Aba Documentação Complementar

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS


08.348.971/0001-39 - MUNICÍPIO DE MOSSORO

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico **Documentação Complementar** QCI PO/CFE LAE Quadro Resumo

Manifesto Ambiental, Outorgas, Autorizações e Declarações

Tipo de documento ↕	Tipo Manifesto Ambiental ↕	Órgão emissor ↕	Data de emissão ▲	Válida até ↕	Meta	Ações
Manifesto Ambiental	Dispensa	SEMA/PR	28/08/2018	18/12/2019	1-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO	



Aba PO/CFF

- ✓ A aba PO/CFF contempla as funcionalidades para preenchimento da Planilha Orçamentária (PO) e Cronograma Físico-Financeiro (CFF) das submetas do Contrato de Repasse/Convênio.
- ✓ Deve ser cadastrada uma PO para cada submeta do QCI.
- ✓ Cada PO será acompanhada de um CFF a ser preenchido após o preenchimento da respectiva PO.

Simulação – Aba PO/CFF

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** Quadro Resumo

ADICIONAR

Planilhas Orçamentárias / Cronogramas

Meta	Submeta	Data Base	Localidade	Previsão de Início da Obra	Duração da Obra (meses)	Obra acompanhada por evento?	Preço Total	Ações
1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO	1.1 - Execução de Obras de Pavimentação	06/2019	RN	09/2019	3	✓	R\$ 240.124,11	 

Na aba “PO/CFF” são listadas as Planilhas Orçamentárias de cada submeta cadastrada na aba “QCI”.

Simulação – Aba Dados Gerais da PO/CFF

Dados Básicos
Anexos
Responsável Técnico
Documentação Complementar
QCI
PO/CFF
Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais
Eventos
Frentes de Obra
PO
PLQ
CFF

Submeta: *

Total Submeta (QCI):

R\$ 240.124,11

Total Submeta (PO):

R\$ 240.124,11

Previsão Início da Obra: *

Duração da Obra (meses): *

O acompanhamento da execução da obra será por eventos.

Data Base: *

Desonerado: *

Localidade: *

Responsável Técnico PO

ART/RRT: *

Responsável:

ADICIONAR

ART/RRT	CPF	Nome	Atividade	Ações
1234567890	081.827.694-00	Neyliane - Engenheira	Engenharia	✖

Responsável Técnico CFF

Responsável: *

ADICIONAR

CPF	Nome	Atividade	Ações
081.827.694-00	Neyliane - Engenheira	Engenharia	✖

SALVAR

Simulação – Aba Dados Gerais da PO/CFF

Data prevista para início da execução da obra (formato mm/aaaa)

Quantidade de meses prevista para conclusão da obra após o seu início

Ao marcar esta opção, a PO será medida pela PLE (*Planilha de Levantamento de Eventos*). Caso não seja marcado, a PO será medida pelo BM (*Boletim de Medição*)

1.1 - Execução de Obras de Pavimentação

Previsão Início da Obra: * 09/2019

Duração da Obra (meses): * 3

O acompanhamento da execução da obra será por eventos.

Data Base: * 06/2019

Desonerado: * Sim

Localidade: * RN

Responsável Técnico PO

ART/RRT: *

Responsável:

ADICIONAR

ART/RRT	CPF	Nome	Atividade	Ações
1234567890	081.827.694-00	Neyliane - Engenheira	Engenharia	

Responsável Técnico CFF

Responsável: *

ADICIONAR

CPF	Nome	Atividade	Ações
081.827.694-00	Neyliane - Engenheira	Engenharia	

SALVAR

Simulação – Aba Dados Gerais da PO/CFF

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF VOLTAR

Submeta: *
1.1 - Execução de Obras de Pavimentação

Total Submeta (QCI): R\$ 240.124,11
Total Submeta (PO): R\$ 240.124,11

Previsão Início da Obra: * 09/2019
Duração da Obra (meses): * 3
 O acompanhamento da execução da obra será por eventos.

Data Base: * 06/2019
Desonerado: * Sim
Localidade: * RN

Responsável Técnico PO

Responsável: _____

ADICIONAR

Nome	Atividade	Ações
Engenheira	Engenharia	

ADICIONAR

Responsável Técnico CFF

Responsável: *

CPF	Nome	Atividade	Ações
081.827.694-00	Neyliane - Engenheira	Engenharia	

SALVAR

Data base utilizada como referência para os preços do orçamento (formato mm/aaaa)

Informação quanto à escolha do regime de tributação sobre a mão de obra da empresa ("sim" – desonerado ; "não" – não desonerado);

Localidade (Estado) utilizada para referência dos preços do orçamento

Simulação – Aba Dados Gerais da PO/CFF

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF VOLTAR

Submeta: * 1.1 - Execução de Obras de Pavimentação Total Submeta (QCI): R\$ 240.124,11 Total Submeta (PO): R\$ 240.124,11

Previsão Início da Obra: * 09/2019 Duração da Obra (meses): * 3

Data Base: * 06/2019 Desonerado: * Sim

Responsável pelo Orçamento da PO:
Só irá aparecer o responsável técnico PO, caso já tenha sido incluída a ART/RRT do tipo “Orçamento” na aba “Responsável Técnico”.

Responsável Técnico PO

ART/RRT: * Responsável:

ADICIONAR

ART/RRT	CPF	Nome	Atividade	Ações
1234567890	081.827.694-00	Neyliane - Engenharia	Engenharia	

Responsável Técnico CFF

Responsável: *

CPF	Nome
081.827.694-00	Neyliane - Engenharia

Responsável Técnico pelo Cronograma Físico Financeiro da PO:
Só irá aparecer o responsável técnico CFF, caso ele já tenha sido incluído como responsável na aba “Responsável Técnico”

Simulação – Aba Frentes de Obra da PO/CFF

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO

Voltar

Versão:







- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF**
- Quadro Resumo

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra**
- PO
- PLQ
- CFF

VOLTAR

ADICIONAR

Frentes de Obra

Número da Frente de Obra	Frente de Obra	Ações
1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	 
4	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	 
5	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	 

As Frentes de Obra são subdivisões da obra em etapas/áreas/alas/regiões/pavimentos/etc determinadas e mensuráveis para fins de levantamento de quantitativos e, posteriormente, realização do acompanhamento de obra (ex.: Rua A, Rua B, 1º Pavimento, 2º Pavimento, Sala 01, Sala 02, Ala Norte, Ala Sul).

Simulação – Aba PO da PO/CFF



















Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF

VOLTAR

ADICIONAR













Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.098,60	 
1.1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,50	M2	R\$ 321,29	R\$ 353,73	24,23 %	R\$ 439,44	R\$ 1.098,60	 
2	—	TERRAPLENAGEM							R\$ 14.307,85	 
2.1	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	4.233,11	M2	R\$ 0,49	R\$ 0,52	24,23 %	R\$ 0,65	R\$ 2.751,52	 
2.2	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	846,61	M3	R\$ 1,67	R\$ 1,57	24,23 %	R\$ 1,95	R\$ 1.650,89	 
2.3	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	5.503,02	M3XKM	R\$ 1,58	R\$ 1,45	24,23 %	R\$ 1,80	R\$ 9.905,44	 
3	—	SUBLEITO							R\$ 19.633,08	 
3.1	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	4.233,11	M2	R\$ 1,26	R\$ 1,26	24,23 %	R\$ 1,57	R\$ 6.645,98	 
3.2	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO	846,61	M3	R\$ 3,03	R\$ 2,93	24,23 %	R\$ 3,64	R\$ 3.081,66	 

Simulação – Aba PO da PO/CFF

Na aba “PO” é elaborada a Planilha Orçamentária de cada submeta cadastrada na aba “QCI”. Nela são preenchidos os macroserviços e os respectivos serviços que compõem o orçamento da obra.

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.098,60	 
1.1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO								
2	-	TERRAPLENAGEM								
2.1	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	4.233							
2.2	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	846,61	M3	R\$ 1,67	R\$ 1,57	24,23 %	R\$ 1,95	R\$ 1.650,89	 
2.3	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	5.503,02	M3XKM	R\$ 1,58	R\$ 1,45	24,23 %	R\$ 1,80	R\$ 9.905,44	 
3	-	SUBLEITO							R\$ 19.633,08	 
3.1	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	4.233,11	M2	R\$ 1,26	R\$ 1,26	24,23 %	R\$ 1,57	R\$ 6.645,98	 
3.2	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO	846,61	M3	R\$ 3,03	R\$ 2,93	24,23 %	R\$ 3,64	R\$ 3.081,66	 

Macrosserviço é um agrupamento de serviços. O “Macrosserviço” deverá ser preenchido com uma breve descrição (Ex.: Serviços Preliminares, Fundações, Instalações Elétricas, etc).

Simulação – Aba PLQ da PO/CFF

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	---------------

Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF
--------------	---------	-----------------	----	------------	-----

[VOLTAR](#)

Planilha de Levantamento Quantitativo

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.098,60					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,50	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.098,60	—	3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	2,50	R\$ 1.098,60
2	TERRAPLENAGEM					R\$ 14.307,85					
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	4.233,11	M2	2	TERRAPLENAGEM	R\$ 2.751,52	—	1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	1.000,00	R\$ 650,00
								2	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	1.000,00	R\$ 650,00
								3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	2.233,11	R\$ 1.451,52
2.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	846,61	M3	2	TERRAPLENAGEM	R\$ 1.650,89	—	1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	300,00	R\$ 585,00
								2	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	300,00	R\$ 585,00
								3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	246,61	R\$ 480,89
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	5.503,02	M3XKM	2	TERRAPLENAGEM	R\$ 9.905,44	—	1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	2.000,00	R\$ 3.600,00
								2	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	2.000,00	R\$ 3.600,00
								3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	1.503,02	R\$ 2.705,44
3	SUBLEITO					R\$ 19.633,08					
3.1	RÉGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	4.233,11	M2	3	SUBLEITO	R\$ 6.645,98	—	1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	1.000,00	R\$ 1.570,00
								2	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	1.000,00	R\$ 1.570,00
								3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	2.233,11	R\$ 3.505,98
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	846,61	M3	3	SUBLEITO	R\$ 3.081,66	—	1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	300,00	R\$ 1.092,00
								2	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	300,00	R\$ 1.092,00
								3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	246,61	R\$ 897,66
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	5.503,02	M3XKM	3	SUBLEITO	R\$ 9.905,44	—	1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	2.000,00	R\$ 3.600,00
								2	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	2.000,00	R\$ 3.600,00
								3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	1.503,02	R\$ 2.705,44
4	BASE					R\$ 45.885,62					
	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO							1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	200,00	R\$ 728,00
								-	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E		

Simulação – Aba CFF da PO/CFF

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

ADICIONAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento	Ações
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	1	 
2	TERRAPLENAGEM	-	1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	1	 
			2	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	1	
			3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	1	
3	SUBLEITO	-	1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	1	 
			2	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	1	
			3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	1	
4	BASE	-	1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	1	 
			2	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	1	
			3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	1	
5	MEIO FIO E SARJETA	-	1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	1	 
			2	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	1	
			3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	1	
6	REVESTIMENTO	-	1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	2	 
			2	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	2	
			3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	2	
7	URBANISMO DO PASSEIO	-	1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	2	 
			2	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	2	
			3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	2	
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	1	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES	3	 
			2	RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA	3	
			3	RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO	3	

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	49,14%	R\$ 117.985,75	49,14%	R\$ 117.985,75
2	49,36%	R\$ 118.521,56	98,49%	R\$ 236.507,31
3	1,51%	R\$ 3.616,80	100,00%	R\$ 240.124,11

Aba Projeto Social

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Proposta 000115/2018



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

[Voltar](#)

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

Projeto Social

LAE

Quadro Resumo

Projeto Social - PTS

Projeto de Trabalho Social

1. Dados da intervenção do Projeto Social

Localização da área de intervenção: *

1000 caracteres restantes.

Objeto da Intervenção Física: *

2000 caracteres restantes.

Caracterização da área de intervenção: *

O Projeto Social deverá ser cadastrado quando no QCI houver um item de investimento referente ao Trabalho Social.

Simulação – Aba Quadro Resumo

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF **Quadro Resumo**

Considerações

Envio da documentação do projeto básico para a análise da Mandatária ou Concedente

Descrição	Tipo	Data de Envio	Enviado por	Perfil	Nome do arquivo	Ações
Nenhum registro encontrado.						

ENVIAR PARA ANÁLISE


Histórico de Comunicações

Data/Hora	Evento	Responsável	Considerações	Situação
03/09/2019 13:58:59	Envio da documentação orçamentária para análise foi cancelado. Situação retornada para "em elaboração"	269.255.753-00 JOSE MARIO BEZERRA MORENO		Em Elaboração
03/09/2019 13:58:54	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente	269.255.753-00 JOSE MARIO BEZERRA MORENO		Enviada para Análise

Histórico de eventos (ações) dentro do Módulo de Projeto Básico

Fase de Análise pelo Concedente ou Mandatária

- ✓ Após o envio para análise do Projeto Básico pelo Conveniente é possível iniciar a análise do Projeto
- ✓ A conclusão da análise será formalizado por meio do Laudo de Análise do Empreendimento (LAE) e/ou Laudo do Trabalho Social (LAS)



Aba LAE



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF **LAE** Quadro Resumo

Laudo de Análise do Empreendimento

1. Enquadramento da proposta de Intervenção

1.1 - Nível do Contrato de Repasse

Nível I

1.2 - Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa?

Sim

1.2.1 - Indicar o Manual Normativo do Programa utilizado para análise, se houver:

SA150v008

1491 caracteres restantes.

1.3 - A proposta de intervenção atende aos limites e especificidades definidas pelos normativos utilizados na análise (prazos, pré-requisitos, soluções executivas, limites percentuais de Projetos, Adm. Local, Serviços Preliminares, etc)? *

Sim

1.4 - Comentários

1500 caracteres restantes.

Aba LAE

2. Titularidade da área de Intervenção

Não se Aplica

2.1 - A descrição contida no documento de titularidade está compatível com a planta de localização apresentada? *

Não se aplica

2.2 - A área de intervenção é compatível com a planta de localização apresentada? *

Sim

2.3 - Informar documento de titularidade apresentado: *

Apresentada Declaração de Área de Domínio Público

2.4 - Comentários

Trata-se de pavimentação de vias públicas, já abertas

1447 caracteres restantes.

3. Adequação ao local de intervenção

Não se Aplica

3.1 - Existe planta de localização da intervenção em escala adequada para sua avaliação? *

Sim

3.2 - A área de intervenção apresenta infraestrutura básica necessária à implementação do empreendimento (pavimentação, drenagem, abast. de água, esg. sanit., energia elet., ilum. publ., coleta resíduos)? *

Sim

Aba LAE

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF **LAE** Quadro Resumo

Laudo de Análise do Empreendimento

10. Orçamento

Não se Aplica

Lote	Submetas	Regime de execução	Acompanhamento por evento	Preço
1	1.1 Execução de Obras de Pavimentação	Empreitada por Preço Global	Sim	R\$ 240.124,11

10.1 - Indicar a data-base do orçamento apresentado para análise (mês/ano) *

06/2019

10.1.1 - Comentários

1500 caracteres restantes.

10.2 - O orçamento apresentado é DESONERADO? *

Sim

10.2.1 - Apresentada declaração informando qual a alternativa adotada e que esta é a mais adequada para a Administração Pública? *

Sim

10.3 - Referências de custo utilizadas: *

SINAPI SICRO Tabelas Oficiais Sistema Especifico Publicações Cotações Outros

10.3.1 - Comentários

Aba LAE



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.348.971/0001-39 - MUNICÍPIO DE MOSSORO

Voltar

Versão:


- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE**
- Quadro Resumo

Laudo de Análise do Empreendimento

1333 caracteres restantes.

15. Documentos Complementares

Não se Aplica

Tipo de documento	Tipo Manifesto Ambiental ↕	Órgão emissor	Data emissão	Válida até	Meta	Link
Manifesto Ambiental	Dispensa	SEMA/PR	28/08/2018	18/12/2019	1-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO	

15.1 - Existe manifestação do órgão do meio ambiente? *

15.2 - As exigências e condicionantes na manifestação ambiental para a área de intervenção foram contempladas em projeto? *

15.3 - Existe Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou do equipamento a ser adquirido, acompanhado de ofício comprovando a comunicação ao respectivo Poder Legislativo do compromisso assumido? *

15.4 - Comentários

Apresentada Declaração de enquadramento do empreendimento na Resolução SEMA 051/2009 que dispensa o licenciamento ambiental

1377 caracteres restantes.

16. Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica

Não se Aplica

Atividade	Nome do profissional Engº/Arqº	Nº registro CREA/CAU	Nº da ART/RRT	Data emissão	Submeta
Engenharia	Neuliana - Engenharia	12345	1234567890	02/00/2010	1.1 Execução de Obras de Pavimentação

Aba LAE

Projeto Básico / Termo de Referência

2013 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS


08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO

Voltar



Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF **LAE** Quadro Resumo

Laudo de Análise do Empreendimento

Descrição	Data do Termo	Responsável por	Termo	Nome do arquivo	Ações
Curva ABC	03/09/2019	NEYLIANE DA CONCEICAO GONCALVES MORENO	Concedente	01 - Tela Inicial Conveniente - v2.png	 

19. Pendências para Próxima Fase

Pendências	Prazos	Submetas	Ações
Conforme Termo de Compromisso apresentado, o Município deverá executar, com recursos próprios, a complementação da rede de drenagem e adequação das bocas de lobo existentes, de acordo com croqui apresentado, e instalar as placas de sinalização e identificação de ruas previstas em projeto	Para Primeiro Desbloqueio	1.1-Execução de Obras de Pavimentação	 

20. Conclusão

A análise Técnica do Empreendimento é limitada aos aspectos de adequabilidade do projeto e valores propostos, com base nos normativos vigentes, não caracterizando corresponsabilidade referente às soluções adotadas pelos autores dos projetos, identificados nas ARTs específicas.

20.1 - Sob os aspectos técnicos, de acordo com os itens acima mencionados, consideramos o empreendimento proposto: *

Viável Inviável


20.2 - Justificativa *

As peças técnicas estão compatíveis entre si e atendem as diretrizes do programa. O orçamento apresentado está compatível com a referência de custo adotada (SINAPI sem desoneração de julho de 2018). As pendências existentes (compromissos assumidos pelo Município) não são impeditivas do prosseguimento do processo.

1186 caracteres restantes.

Aceite ou Rejeição do Projeto Básico

- ✓ Após a emissão do laudo, o projeto básico pode ser:
 - ✓ Aceito ou Rejeitado
- ✓ O aceite ou rejeição deve ser feito na Aba Quadro Resumo

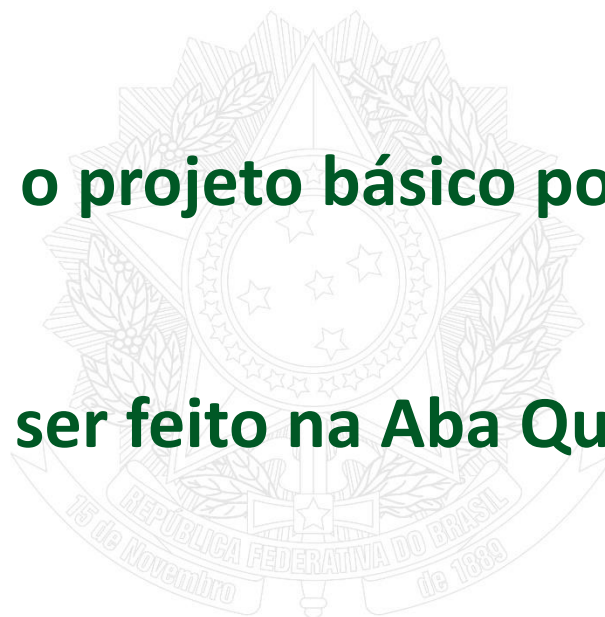

Aceite ou Rejeição do Projeto Básico



Usuário: NEYLIANE DA CONCEICAO GONCALVES MORENO
CPF: 081.827.694-00

Sair do Sistema 03/09/2019 14:21 - v.3.6.4-b365

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Administração
- TCE
- Verificação de Regularidade
- CPS

Projeto Básico / Termo de Referência

2013 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Proposta 004194/2019



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO

Voltar

Versão:

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFP
- LAE
- Quadro Resumo

Considerações

ADICIONAR ANEXO

Descrição	Tipo	Data de Envio	Enviado por	Perfil	Nome do arquivo	Ações
Nenhum registro encontrado.						

SOLICITAR COMPLEMENTAÇÃO

REJEITAR

ACEITAR

Histórico de Comunicações

Data/Hora	Evento	Responsável	Considerações	Situação
03/09/2019 14:31:26	Emitir Laudo de Análise do Empreendimento	081.827.694-00 NEYLIANE DA CONCEICAO GONCALVES MORENO	As peças técnicas estão compatíveis entre si e atendem as diretrizes do programa. O orçamento apresentado está compatível com a referência de custo adotada (SINAPI sem desoneração de julho de 2018). As pendências existentes (compromissos assumidos pelo Município) não são impeditivas do prosseguimento do processo.	Em Análise
03/09/2019 14:22:06	Análise iniciada pela Mandatária/Concedente	081.827.694-00 NEYLIANE DA CONCEICAO GONCALVES MORENO		Em Análise
03/09/2019 14:12:36	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente	269.255.753-00 JOSE MARIO BEZERRA MORENO		Enviada para Análise
03/09/2019 13:58:59	Envio da documentação orçamentária para análise foi cancelado. Situação retornada para "em elaboração"	269.255.753-00 JOSE MARIO BEZERRA MORENO		Em Elaboração
03/09/2019 13:58:54	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente	269.255.753-00 JOSE MARIO BEZERRA MORENO		Enviada para Análise

Homologação da SPA

- ✓ A conclusão da análise técnica é consolidada pela Síntese do Projeto Aprovado (SPA)
- ✓ Para convênios e Contratos de Repasse de Nível I, a homologação da SPA é automática
- ✓ Para contratos de Repasse de Nível II e III, é necessária a homologação da SPA pelo órgão Concedente

Aba - SPA

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE **SPA** Quadro Resumo

Síntese do Projeto Aprovado

1. Identificação

Programa

2011320190493 - Programa - Convênio - Neyliane

Objeto

Pavimentação Asfáltica em ruas do município: Rua Dom Pedro entre a avenida Bento Gonçalves até a Rua Bahia; Rua Bahia entre a Dom Pedro e Passo Fundo; Rua Passo Fundo entre a Rua Bahia e Rua Amazonas

Ação Orçamentária

00000000

Programa de Trabalho

Município do Proponente

MOSSORO

Código IBGE do Município

2408003

UF do Proponente

RN

2. Dados do Convênio

Número da Proposta

4194/2019

Número do Convênio

Data de Assinatura

Valor Global

R\$ 240.124,11

Repasse

R\$ 232.380,95

Contrapartida

R\$ 7.743,16

Prazo de Execução

3 meses

3. Participantes

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Proponente	Administração Pública Municipal	08.348.971/0001-39 - MUNICIPIO DE MOSSORO	017.221.448-31 - MARIO ARTEMIO URCHEI		
Concedente	-	20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	936.946.791-20 - ANTONIO DE BRITO VIDAL NETO	(87) 3762 7044	planejamento@garanhuns.pe.gov.br

Aba - SPA

4. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repassé	Contrapartida	Total
1	— Pavimentação	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO			3.794,37	M2	R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11
1.1		Execução de Obras de Pavimentação	Empreitada por Preço Global	RUA DOM PEDRO II - RUA BAHIA E AV. BENTO GONÇALVES RUA PASSO FUNDO - RUA AMAZONAS E RUA BAHIA RUA BAHIA - RUA DOM PEDRO II E RUA PASSO FUNDO			R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11
Total Geral							R\$ 232.380,95	R\$ 7.743,16	R\$ 240.124,11
Diferença do Valor Orçado (Proposta)							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO	R\$ 240.124,11	—				
			1	SET/2019	49,14%	49,14%	R\$ 117.985,75
			2	OUT/2019	49,36%	98,49%	R\$ 236.507,31
			3	NOV/2019	1,51%	100,00%	R\$ 240.124,11

Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela	Investimento	Repassé	Contrapartida	Outros	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SET/2019	—				49,14%	49,14%	R\$ 117.985,75
			47,55%	1,58%	0,00%			R\$ 114.186,61
				1,59%	0,00%			R\$ 3.799,14
				0,00%	0,00%			R\$ 0,00
2	OUT/2019	—				49,36%	98,49%	R\$ 236.507,31
			47,77%	1,59%	0,00%			R\$ 228.891,77
				1,59%	0,00%			R\$ 7.615,54
				0,00%	0,00%			R\$ 0,00
3	NOV/2019	—				1,51%	100,00%	R\$ 240.124,11
			1,46%	0,05%	0,00%			R\$ 232.392,11
				0,05%	0,00%			R\$ 7.732,00
				0,00%	0,00%			R\$ 0,00

Aba - SPA

6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa? Sim

7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC? Não

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

Conforme termo de compromisso do Município deverá ser executada a complementação da rede de drenagem, com recursos próprios, até a primeira solicitação de desbloqueio de recursos

8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
SEMA/PR	28/08/2018	18/12/2019	Dispensa	1-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO

9. Responsáveis Técnicos

Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	ART/RRT	Data de Emissão
081.827.694-00	Neyliane - Engenheira	Engenharia	12345	1234567890	02/09/2019

Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF	Nome	Atividade	Formação	Órgão do Responsável
Nenhum registro encontrado.				

10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

Justificativa:

As peças técnicas estão compatíveis entre si e atendem as diretrizes do programa. O orçamento apresentado está compatível com a referência de custo adotada (SINAPI sem desoneração de julho de 2018). As pendências existentes (compromissos assumidos pelo Município) não são impeditivas do prosseguimento do processo.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

www.economia.gov.br



Nova CENTRAL DE ATENDIMENTO do Sistema de Convênios - SICONV

0800 978 9008

Clique aqui para maiores informações

